Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Mission de repérage réalisée selon les dispositions des articles R1334-19 et R1334-22 du Code de la santé publique, et conformément à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, ainsi qu'à la norme NF X46-020.

ADRESSE DU BIEN

Adresse : 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN

Référence client : MM06_01_0012

Date du repérage : 14/01/2019

Désignation : MM06_01_0012



SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société
- A-5 - Liste des locaux visités

B- Etude préalable
- B-1 - Descriptif des travaux envisagés
- B-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- B-3 - Objectif de la mission
- B-4 - Document(s) mis à disposition
- B-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- B-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- B-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- B-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

C - Conditions de repérage
- C-1 - Modalités de repérage
- C-2 - Moyens d'investigation

D - Conclusions
- D-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- D-2 - Réserves / Commentaires
- D-3 - Locaux ou partie de locaux non visités

E - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Mesurage des zones amiantées
Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

PRÉSENCE D'AMIANTE

Non

PRÉSENCE DE PIÈCES NON VISITÉES

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN

Référence client : MM06_01_0012

Désignation : MM06_01_0012

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES
953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341
40011 MONT de MARSAN

Donneur d'ordre :
OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES
953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341
40011 MONT de MARSAN

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VERGEZ Kévin

Accompagnateur : Charles-Aristide Elie (05 33 89 12 90)

Date de repérage 14/01/2019

Numéro attestation : Amiante

Délivré le : 03/03/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 22/01/2019

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019)

A Riorges, le 22/01/2019

A-5 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	MM06_01_0012 - Vol 2 (Salon)
MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)
MM06_01_0012 - Vol 5 (W.C)	MM06_01_0012 - Vol 6 (Chambre 1)
MM06_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)	MM06_01_0012 - Vol 8 (Extérieur)

B - ÉTUDE PRÉALABLE

B-1 DESCRIPTIF DES TRAVAUX ENVISAGÉS

Reprise des endutis muraux.
Travaux de peinture courant sur les plafonds.
Remplacement de la menuiserie dans la cuisine.
Mises en peinture des menuiseries.
Poncage du parquet dans la chambre 1.

B-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ

Le périmètre d'intervention concerne l'entrée, le salon, les chambres 1 et 2, la cuisine, les wc et la salle de bain.

B-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

B-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION

Aucun

B-5 PÉRIMÈTRE ET PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'OPÉRATEUR

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine) - Vol 8 (Extérieur)	

B-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

B-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

B-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

C - CONDITIONS DE REPÉRAGE

C-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

C-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

D - CONCLUSIONS

D-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

D-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

D-3 LOCAUX OU PARTIE DE LOCAUX NON VISITÉS

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

E - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 2 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP002909 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 2 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP002909 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002FP002909 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP002909 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 5 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP002909 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S12 - S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP002909 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002FP002909 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002FP002909 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P7	Réalisation d'un prélevement		002FP002909 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP002909 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 5 (W.C)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00290 9 n°7 - 2	P7	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélevement		002FP00290 9 n°10 - 2	P10	Mousse grise en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement		002FP00290 9 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 2 (Salon)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00290 9 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00290 9 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00290 9 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 2 (Salon) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP002909 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002FP002909 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP002909 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP002909 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP00290 9 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM06_01_0012	Vol 8 (Extérieur)	Revêtement de sol	Chape maigre (base ciment)	P8	Réalisation d'un prélevement	Seuil porte	002FP00290 9 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P9	Réalisation d'un prélevement		002FP00290 9 n°9 - 2	P9	Colle grise en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : MESURAGE DES ZONES AMIANTÉES

Les mesurages contenus dans le tableau suivant sont donnés a titre indicatifs et doivent impérativement faire l'objet d'un contrôle par les intervenants et ne peut en aucun cas être utilisé comme quantitatif pour chiffrage.

Ref prél.	Composant	Matériau	Localisation	Mesurage lineaire	Mesurage hauteur	Mesurage surface	Mesurage unité


Néant

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	MM06_01_0012	MM06_01_0012 - Plan de repérage - Actions menées

MM06_01_0012 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FP002909

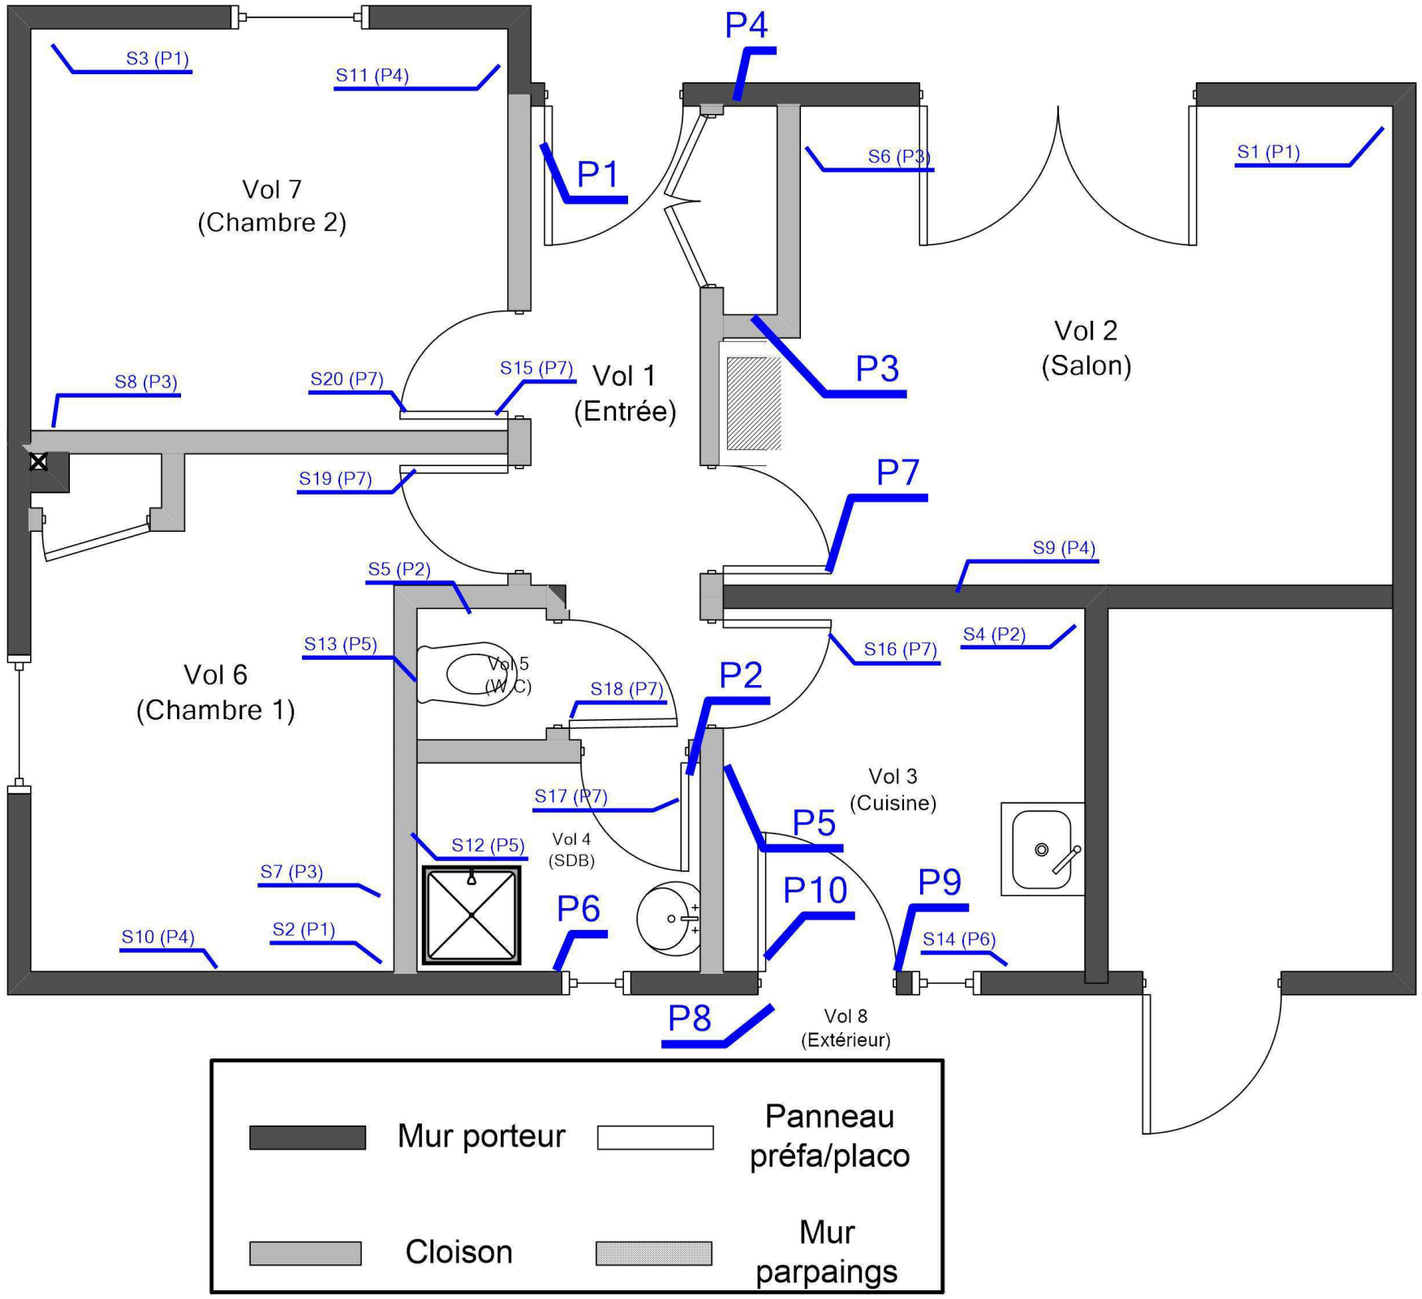

Légende

P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN	MM06_01_0012	14/01/2019	VERGEZ Kévin


ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FP002909 n°1 - 2 (P1)	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP002909 n°2 - 2 (P2)	MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002FP002909 n°3 - 2 (P3)	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP002909 n°4 - 2 (P4)	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP002909 n°5 - 2 (P5)	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP002909 n°6 - 2 (P6)	MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002FP002909 n°7 - 2 (P7)	MM06_01_0012 - Vol 2 (Salon)	Prélevement négatif
002FP002909 n°8 - 2 (P8)	MM06_01_0012 - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
002FP002909 n°9 - 2 (P9)	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP002909 n°10 - 2 (P10)	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif



002FP002909 n°1 - 2 (P1) - MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)

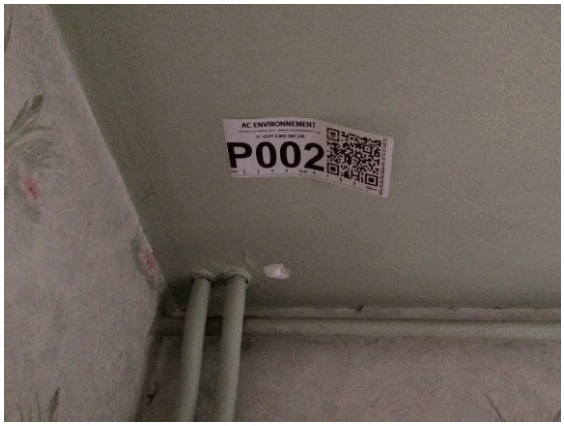

002FP002909 n°2 - 2 (P2) - MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)



002FP002909 n°3 - 2 (P3) - MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)



002FP002909 n°4 - 2 (P4) - MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)



002FP002909 n°5 - 2 (P5) - MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)



002FP002909 n°6 - 2 (P6) - MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)



002FP002909 n°7 - 2 (P7) - MM06_01_0012 - Vol 2 (Salon)



002FP002909 n°8 - 2 (P8) - MM06_01_0012 - Vol 8 (Extérieur)



002FP002909 n°9 - 2 (P9) - MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)



002FP002909 n°10 - 2 (P10) - MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 4 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples en vrac - -	MM06_01_0012 - Vol 2 (Salon)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 8 (Extérieur)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse grise en vrac + peinture non séparable - -	MM06_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-3722 EN DATE DU 22/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0719-3722 Réf. Commande Client : 002FP002909

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 17/01/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012			Réf échantillon ITGA : IT071901-27820	
Réf échantillon client : 002FP002909001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012			Réf échantillon ITGA : IT071901-27821	
Réf échantillon client : 002FP002909002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 4 (SDB)			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META (1)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-3722 EN DATE DU 22/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA : IT071901-27822		
Réf échantillon client : 002FP002909003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA : IT071901-27823		
Réf échantillon client : 002FP002909004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	22/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA : IT071901-27824		
Réf échantillon client : 002FP002909005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Matériau plâtreux gris en vrac		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + matériau plâtreux gris en vrac non séparable	META (1)	1	22/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA : IT071901-27825		
Réf échantillon client : 002FP002909006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 4 (SDB)		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META (1)	1	22/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA : IT071901-27826		
Réf échantillon client : 002FP002909007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture sur boiserie / Vol 2 (Salon)		Description ITGA : Peintures multiples en vrac		
Peintures multiples en vrac	META (1)	1	22/01/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-3722 EN DATE DU 22/01/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA :		IT071901-27827
Réf échantillon client : 002FP002909008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre (base ciment) / Vol 8 (Extérieur)		Description ITGA :		Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples
Enduit compact gris hétérogène + peintures multiples non séparable	META (1)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA :		IT071901-27828
Réf échantillon client : 002FP002909009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA :		Colle grise en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité / Carrelage en vrac
Colle grise en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META (1)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -
Carrelage en vrac	---			Non analysé
Réf dossier client : MM06_01_0012 17 rue Ferdinand Bernede - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0012		Réf échantillon ITGA :		IT071901-27829
Réf échantillon client : 002FP002909010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA :		Mousse grise en vrac / Peinture / Bois en vrac
Mousse grise en vrac + peinture non séparable	META (2)	1	21/01/2019	Amiante non détecté / -
Bois en vrac	---			Non analysé

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

QBE

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE/ RC PRODUITS LIVRES	
Tous dommages confondus Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus Dont	1 500,000 € par *Année d'assurance*
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus trouvant sur origine dans une erreur de diagnostic	350 000 € par sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 21 Décembre 2018

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud-Est
1 boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03
Gestion des polices : 04 26 83 82 76

Page 3 / 3

Assurance 3/3

QBE

- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat
- Diagnostiques d'assainissement collectif et individuel .
- Diagnostic d'accessibilité Handicapés

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sol
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

Page 2 / 3

Assurance 2/3

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Savigny-Sur-Orges le 02/03/1977, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - TERMITES - DPE - GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT en la personne de Denis MORA est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : tes personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle QBE N°AM895928 renouvelable avec tacite reconduction de la SAS AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 08 juin 2018

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - ac.contact@ac-environnement.com
N° Vert 0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.QBEIurope.com

QBE

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
SIREN N° 441 355 914
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés:
  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non collectif
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - Loi SRU, certificat de logement décent
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France, inscrite sur le RCS de Nanterre sous le numéro B 414 108 001. Son siège social est situé Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni.
QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais au capital de GBP 160 000 000.
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group.
QBE Insurance (Europe) Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et est régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni.
Elle est immatriculée en Angleterre sous le n° 1741361.

Page 1 / 3

Assurance 1/3

ANNEXE: DOCUMENTS



I.Cert Institut de Certification

Décision de certification

AC ENVIRONNEMENT
à l'attention de VERGEZ Kévin
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Nous avons l'honneur de vous transmettre vos résultats d'examens de certification.

Amiante sans mention **Réussite à la certification** **Date de décision : 03/03/2017**

AMIANTE RECERTIFICATION
Les conditions de recertification amiante prévoient également la réalisation d'une surveillance documentaire liée à l'exercice de votre activité de diagnostiqueur Amiante.
La réussite de votre examen de recertification AMIANTE ne pourra être prononcée que lorsque cette surveillance documentaire sera validée.

Le cas échéant, votre certificat de compétences vous sera adressé prochainement.
Si vous avez échoué à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter pour planifier des sessions de rattrapage - 0810 057 570.
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Date : 03/03/2017

Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02 90 09 35 02 - Fax : 02 99 65 07 25 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 20 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - Amiante
