Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	207 rue Capitaine Bonnemaire - Porte 0016
CP - Ville :	40000 MONT DE MARSAN
Référence client :	MM06_01_0016
Date du repérage :	02/05/2018
Désignation :	MM06_01_0016



Présence d'amiante	Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)	Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs	Annexe : Mesurage des zones amiantées
A - Désignation de l'immeuble	Annexe : Plans
B - Propiétaire / Donneur d'ordre	Annexe : Reportage photographique
C - Opérateur de repérage	Annexe : Prélevements et analyses
D - Personne autorisant l'émission du rapport	
E - Pièces visitées	
- Etude Préalable	
F - Descriptif des travaux envisagés	
G - Périmètre du bâtiment concerné	
H - Objectif de la mission	
I - Document(s) mis à disposition	
J - Périmètre et programme de repérage	
K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements	
L - Adjonction(s) ou exclusion(s)	
M - Conditions existantes	
Conditions de repérage	
N - Modalités de repérage	
O - Moyens d'investigation	
Conclusions	
P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage	
Q - Réserves / Commentaires	
R - Locaux ou partie de locaux non visités	
Grille de résultats du repérage	

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	207 rue Capitaine Bonnemaire - Porte 0016 40000 MONT DE MARSAN
Référence client :	MM06_01_0016
Désignation :	MM06_01_0016
Date de construction :	Avant 1997

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES

Adresse : 953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341 40011 MONT de MARSAN Cedex

Donneur d'ordre : OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES

Adresse : 953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341 40011 MONT de MARSAN Cedex

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	DAGRAU Jérémie
Accompagnateur :	Dagrau Jérémie (05 33 89 12 90)
Date de repérage	02/05/2018

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : CPDI 2580 V3
Délivré le : 03/08/2017

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 11/05/2018
A Riorges, le 11/05/2018

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début:01/01/2018 - fin:3

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	MM06 01 0016 - Vol 2 (W.C)
MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)
MM06 01 0016 - Vol 5 (Dégagement)	MM06 01 0016 - Vol 6 (SDB)
MM06 01 0016 - Vol 7 (Chambre 2)	MM06 01 0016 - Vol 8 (Chambre 1)
MM06 01 0016 - Vol 9 (Façade)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

- Réfection intérieure totale du logement suite à un incendie.
- Peinture façade avant.

G Périmètre du bâtiment concerné

- Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble du logement et la façade avant.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Plafond et faux-plafonds	MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	
Revêtement de sol	MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (SDB)	
Revêtement de mur	MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	
Façades	MM06 01 0016	Vol 9 (Façade)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 9 (Façade)	Murs	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélevement		002YJ0007 43 n°1 - 2	P1	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 9 (Façade)	Murs	Enduit ciment	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002YJ0007 43 n°1 - 2	P1	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002YJ0007 43 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ0007 43 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ0007 43 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002YJ000743 n°4 - 2	P4 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P5 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002YJ000743 n°5 - 2	P5	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 1	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P6 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002YJ000743 n°6 - 2	P6 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 1	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 2	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002YJ000743 n°7 - 2	P7 Phase 3	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P8 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002YJ000743 n°8 - 2	P8 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Réalisation d'un prélevement	cheminée séjour	002YJ000743 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduits ciment	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	cheminée séjour	002YJ000743 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 2	Matériau de type peinture (marron) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P12 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002YJ000743 n°12 - 2	P12 Phase 3	Matériau de type peinture (marron) (foncé)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°15 - 2	P15	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Menuiseries	Mastic vitrier	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002YJ000743 n°15 - 2	P15	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 1	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 8 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002YJ000743 n°2 - 2	P2 Phase 2	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002YJ000743 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002YJ000743 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau dur de type ciment-colle (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°14 - 2	P14	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002YJ000743 n°14 - 2	P14	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002YJ000743 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002YJ000743 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°10 - 2	P10 Phase 1	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°10 - 2	P10 Phase 2	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreux) (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002YJ000743 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol


				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélevement		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
MM06 01 0016	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002YJ0007 43 n°11 - 2	P11 Phase 3	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse


ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	MM06 01 0016	MM06 01 0016 - Plan de repérage - Actions menées

MM06 01 0016 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence: 002YJ000743

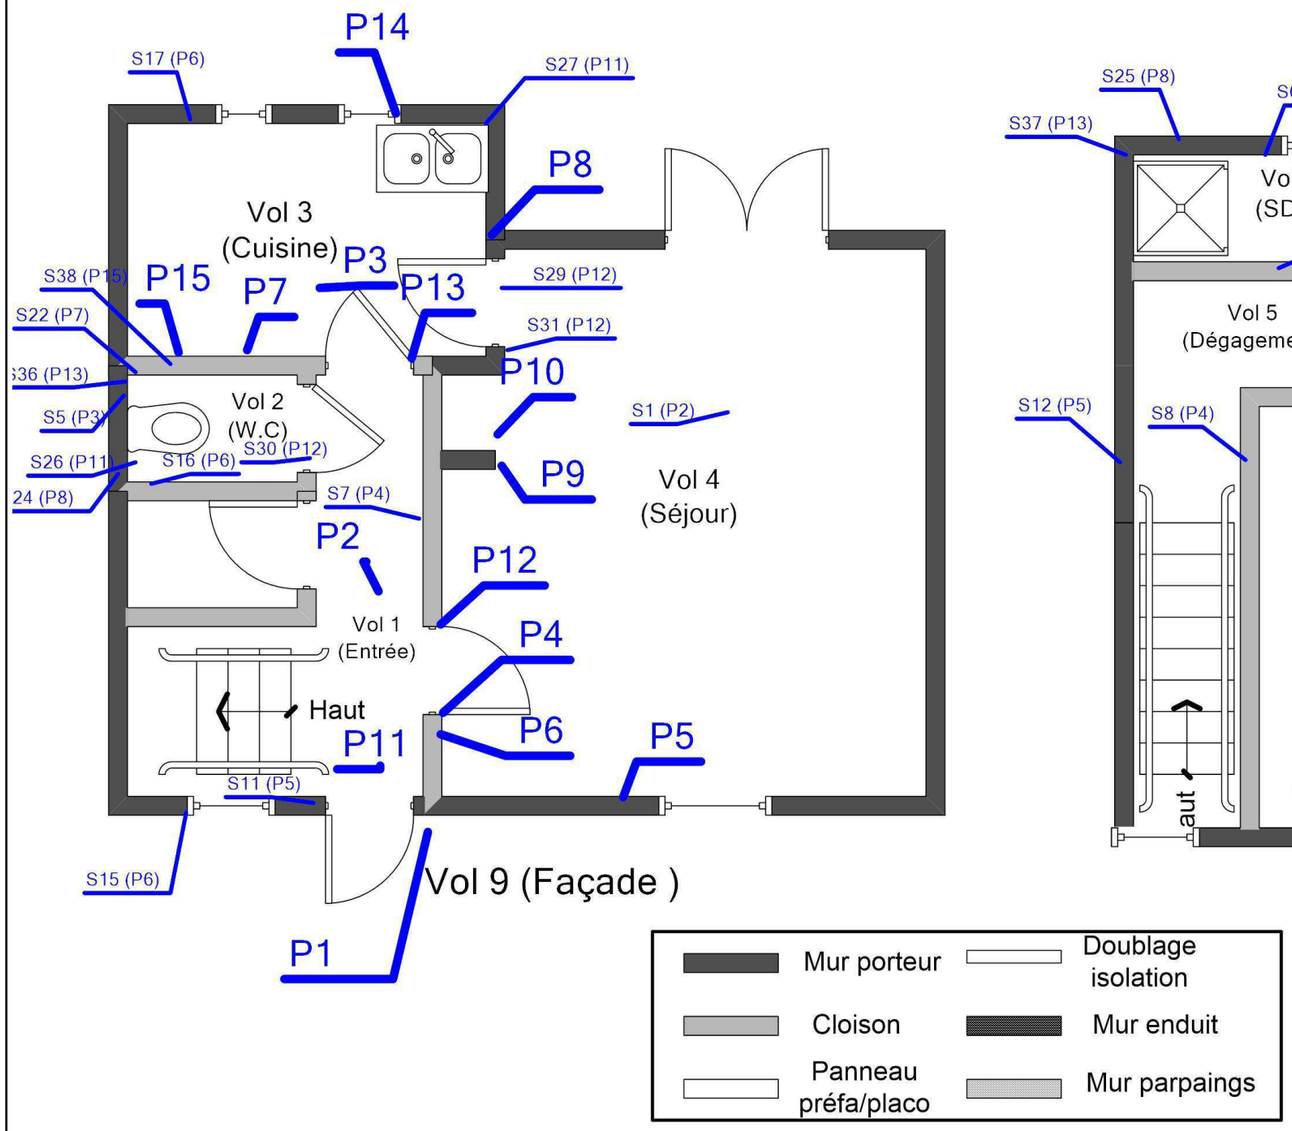

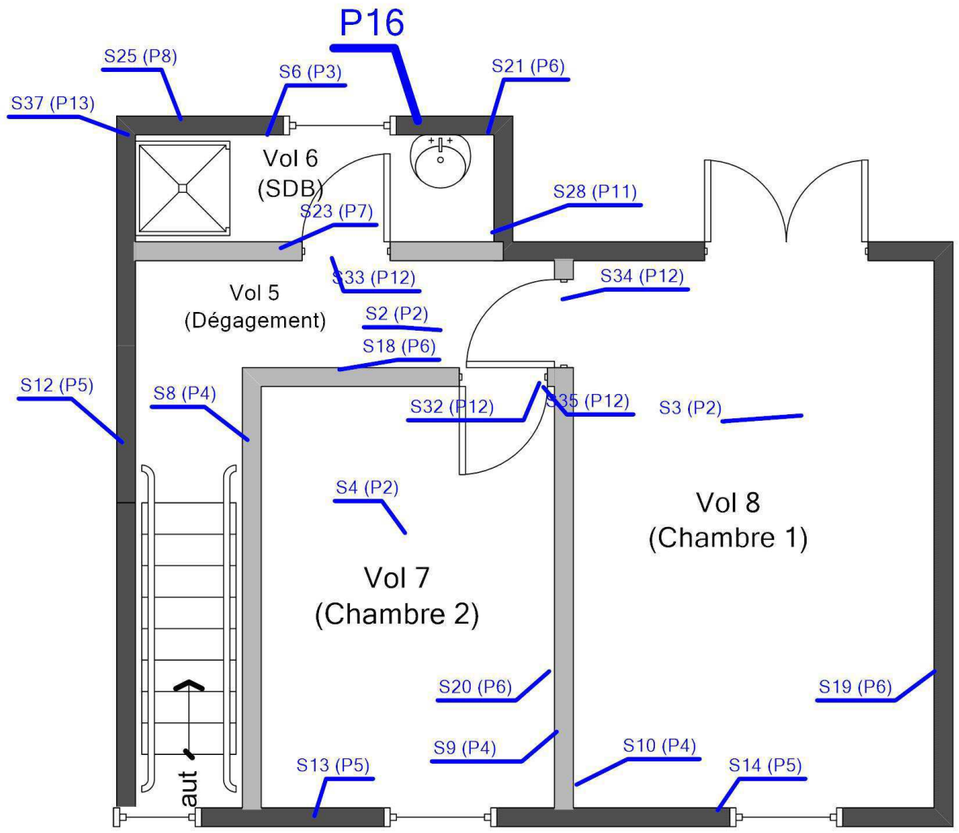

Légende	
P	Localisation dun prélèvement
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
207 rue Capitaine Bonnemaire - Porte 0016 40000 MONT DE MARSAN	MM06_01_0016	02/05/2018	DAGRAU Jérémie

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002YJ000743 n°1 - 2 (P1)	MM06 01 0016 - Vol 9 (Façade)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°15 - 2 (P15)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°14 - 2 (P14)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°13 - 2 (P13)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°12 - 2 (P12)	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°11 - 2 (P11)	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°10 - 2 (P10)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°9 - 2 (P9)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°7 - 2 (P7)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°6 - 2 (P6)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°5 - 2 (P5)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°4 - 2 (P4)	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°3 - 2 (P3)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°2 - 2 (P2)	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°8 - 2 (P8)	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002YJ000743 n°16 - 2 (P16)	MM06 01 0016 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif

002YJ000743 n°1 - 2 (P1)



002YJ000743 n°15 - 2 (P15)



002YJ000743 n°14 - 2 (P14)



002YJ000743 n°13 - 2 (P13)



002YJ000743 n°12 - 2 (P12)



002YJ000743 n°11 - 2 (P11)



002YJ000743 n°10 - 2 (P10)



002YJ000743 n°9 - 2 (P9)



002YJ000743 n°7 - 2 (P7)



002YJ000743 n°6 - 2 (P6)



002YJ000743 n°5 - 2 (P5)



002YJ000743 n°4 - 2 (P4)



002YJ000743 n°3 - 2 (P3)



002YJ000743 n°2 - 2 (P2)



002YJ000743 n°8 - 2 (P8)



002YJ000743 n°16 - 2 (P16)



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Façades	Murs	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris) - -	MM06 01 0016 - Vol 9 (Façade)	
P2 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P2 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P3 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P3 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P4 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P4 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P6 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P6 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P7 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P7 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P7 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	

P8 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P8 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreux) (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 4 (Séjour)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P11 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau de type peinture (marron) (clair) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	
P12 Phase 3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau de type peinture (marron) (foncé) - -	MM06 01 0016 - Vol 1 (Entrée)	

P13 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P13 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (gris) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige) - -	MM06 01 0016 - Vol 3 (Cuisine)	
P16 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 6 (SDB)	
P16 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc) - -	MM06 01 0016 - Vol 6 (SDB)	

eurofins | Analyses pour le Bâtiment

AC ENVIRONNEMENT
Jeremie DAGRAU
64 Rue Clément Ader
42153 RIORGES

Numéro de dossier : 18Y016334
Référence de dossier : 002YJ000743
MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif à l'échantillon suivant :

- N° 18Y016334-001 - Référence *002YJ000743 n°1 / Vol 9 (Façade) / Façades - Murs - Enduit ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-002 - Référence *002YJ000743 n°2 / Vol 1 (Entrée) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-003 - Référence *002YJ000743 n°3 / Vol 3 (Cuisine) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-004 - Référence *002YJ000743 n°4 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-005 - Référence *002YJ000743 n°5 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-006 - Référence *002YJ000743 n°6 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-007 - Référence *002YJ000743 n°7 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-008 - Référence *002YJ000743 n°8 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-009 - Référence *002YJ000743 n°9 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-010 - Référence *002YJ000743 n°10 / Vol 4 (Séjour) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-011 - Référence *002YJ000743 n°11 / Vol 1 (Entrée) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-012 - Référence *002YJ000743 n°12 / Vol 1 (Entrée) / Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture sur boiserie*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-013 - Référence *002YJ000743 n°13 / Vol 3 (Cuisine) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-014 - Référence *002YJ000743 n°14 / Vol 3 (Cuisine) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-015 - Référence *002YJ000743 n°15 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

- N° 18Y016334-016 - Référence *002YJ000743 n°16 / Vol 6 (SDB) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)*, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
F-42016 ST ETIENNE CEDEX 1
Tél: +33 4 77 92 36 30 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/hdb
S.A.S. au capital de 419 090 € RCS Saint-Etienne SIRET 529 294 027 00030 TVA FR47 529 294 027 APE 7120B

EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-EST SAS
REFERENT SOUS TRAITANT
EUROFINS ABSE
2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-017352-01 Version du : 10/05/2018 20:55
Dossier N° : 18EK027999 Date de réception : 08/05/2018
Référence dossier : 18Y016334 - 002YJ000743MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
001	18Y016334-001 - 002YJ000743 n°1 / Vol 9 (Façade) / Façades - Murs - Enduit ciment	Matériau semi-dur (noir) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
002	18Y016334-002 - 002YJ000743 n°2 / Vol 1 (Entrée) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (marron) (foncé) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
003	18Y016334-003 - 002YJ000743 n°3 / Vol 3 (Cuisine) / Plafond et faux-plafonds - Plafonds - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
004	18Y016334-004 - 002YJ000743 n°4 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Matériau de type peinture (beige) (foncé) ; matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-017352-01 Version du : 10/05/2018 20:55

Dossier N° : 18EK027999 Date de réception : 08/05/2018
Référence dossier : 18Y016334 - 002YJ000743MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
005	18Y016334-005 - 002YJ000743 n°5 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Matériau de type peinture (noir) ; matériau semi-dur de type enduit (marron)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
006	18Y016334-006 - 002YJ000743 n°6 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Joint de scellement	Matériau semi-dur (beige) (foncé) ; matériau semi-dur de type plâtre (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
007	18Y016334-007 - 002YJ000743 n°7 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre	Matériau de type maillage de fibres et liant (marron) + (blanc) ; matériau semi-dur (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
008	18Y016334-008 - 002YJ000743 n°8 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
009	18Y016334-009 - 002YJ000743 n°9 / Vol 4 (Séjour) / Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits ciment	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-017352-01 Version du : 10/05/2018 20:55 Page 3/5

Dossier N° : 18EK027999 Date de réception : 08/05/2018
Référence dossier : 18Y016334 - 002YJ000743MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
010	18Y016334-010 - 002YJ000743 n°10 / Vol 4 (Séjour) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques	Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau souple de type revêtement de sol (jaune) ; matériau de type colle (jaune) ; matériau (fibreux) (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
011	18Y016334-011 - 002YJ000743 n°11 / Vol 1 (Entrée) / Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage	Matériau semi-dur (gris) (foncé) ; matériau semi-dur (gris) (clair) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau dur de type joint ciment (gris) (clair)(i)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
012	18Y016334-012 - 002YJ000743 n°12 / Vol 1 (Entrée) / Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Peinture sur boiserie	Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (marron) (clair)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau de type peinture (marron) (foncé)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
013	18Y016334-013 - 002YJ000743 n°13 / Vol 3 (Cuisine) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe)	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-017352-01 Version du : 10/05/2018 20:55 Page 4/5

Dossier N° : 18EK027999 Date de réception : 08/05/2018
Référence dossier : 18Y016334 - 002YJ000743MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

N° éch.	Référence client	Description visuelle de la couche	Technique utilisée	Préparation		Résultats
				Nb	Type	
		Matériau dur de type ciment-colle (gris)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
014	18Y016334-014 - 002YJ000743 n°14 / Vol 3 (Cuisine) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Matériau semi-dur (noir) ; matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (gris) en traces	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
015	18Y016334-015 - 002YJ000743 n°15 / Vol 3 (Cuisine) / Parois verticales intérieures et enduits - Menuiseries - Mastic vitrier	Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
016	18Y016334-016 - 002YJ000743 n°16 / Vol 6 (SDB) / Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence)	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau (fibreux) (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées
		Matériau (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type joint ciment (blanc)	**MET**	1	Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MET : Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou par attaque acide. Détection et identification par Microscopie Electronique à Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée à partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996, MO/HBA/MAT/S2-06: version 2 et de la législation française : Arrêté du 6 Mars 2003.

NB 1 : Les informations de traçabilité sont disponibles sur demande. Il est à noter que ce rapport en français est une copie de la version originale du rapport en langue portugaise et stockée en interne par le laboratoire.
NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.
NB 3 : Le prélèvement relève de la responsabilité du client.
NB 4 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. Il garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0.1% en masse.
NB 5 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° L0705 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

Observation(s) couche(s)

(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação L0705 ISO/IEC 17025 Ensaios

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-18-EK-017352-01 Version du : 10/05/2018 20:55

Dossier N° : 18EK027999 Date de réception : 08/05/2018
Référence dossier : 18Y016334 - 002YJ000743MM06_01_0016 - 40000 MONT DE MARSAN

Validé et approuvé par :



Rui Gomes
Signataire rapport


La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document ne sont pas couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

DOCUMENTS

Référence : 002YJ000743

Annexe : Documents

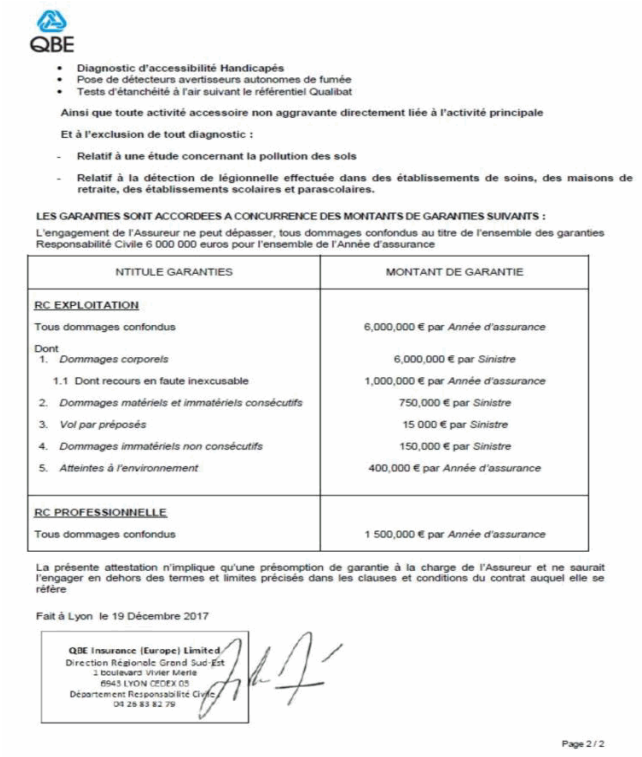

- Diagnostic d'accessibilité Handicapés
- Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- **Relatif à une étude concernant la pollution des sols**
- **Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.**

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1 500,000 € par *Année d'assurance*


La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 19 Décembre 2017

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud-Est
2 boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 05
Département Responsabilité Civile
04 26 83 82 79

Page 2 / 2

Assurance 2/2

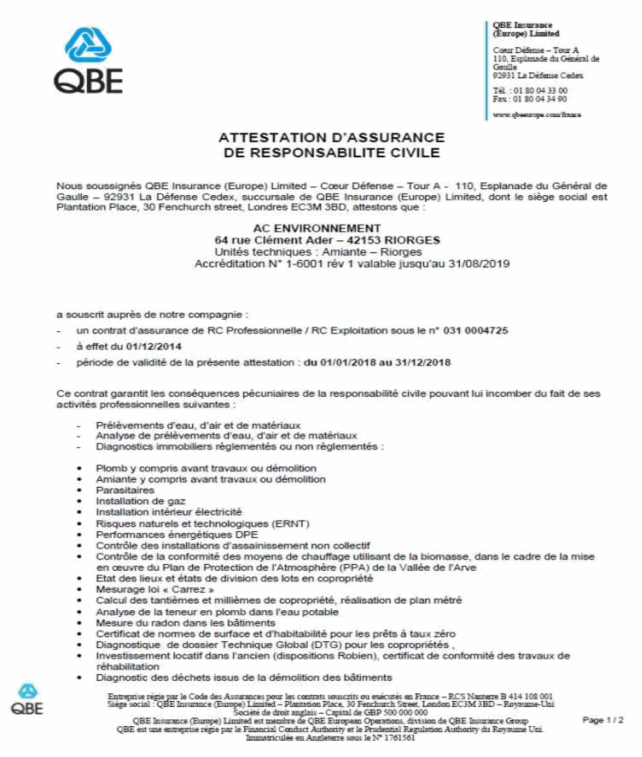

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.qbeeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2018 au 31/12/2018**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :


- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés :

- Plomb y compris avant travaux ou démolition
- Amiante y compris avant travaux ou démolition
- Parasitaires
- Installation de gaz
- Installation intérieur électricité
- Risques naturels et technologiques (ERNT)
- Performances énergétiques DPE
- Contrôle des installations d'assainissement non collectif
- Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
- Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
- Mesurage loi « Carrez »
- Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
- Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
- Mesure du radon dans les bâtiments
- Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
- Diagnostique de dossier Technique Global (DTG) pour les copropriétés ,
- Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
- Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Page 1 / 2

Assurance 1/2

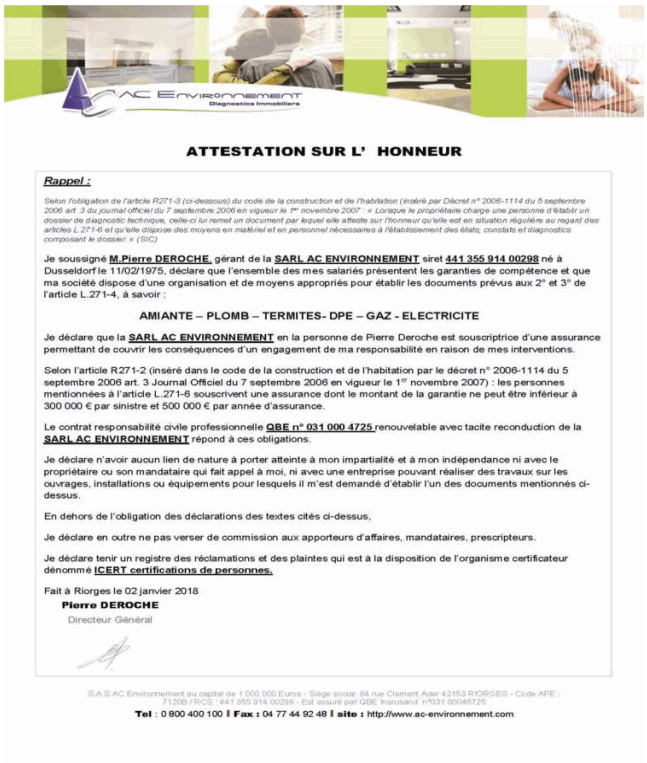

AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné **M.Pierre DEROCHE**, gérant de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** siret **441 355 914 00298** né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la **SARL AC ENVIRONNEMENT** en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R.271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle **QBE n° 031 000 4725** renouvelable avec tacite reconduction de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé **ICERT certifications de personnes.**

Fait à Riorges le 02 janvier 2018

Pierre DEROCHE

Directeur Général

S.A.S AC Environnement au capital de 1 000 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par QBE Insrusand n°031 00045725

Tel : 0 800 400 100 ‖ **Fax :** 04 77 44 92 48 ‖ **site :** http://www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI2580 Version 003

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DAGRAU Jérémie

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	**Amiante Avec Mention**** **Date d'effet : 03/08/2017 - Date d'expiration : 02/08/2022**
Amiante sans mention	**Amiante Sans Mention*** **Date d'effet : 03/08/2017 - Date d'expiration : 02/08/2022**
Electricité	**Etat de l'installation intérieure électrique** **Date d'effet : 01/02/2016 - Date d'expiration : 31/01/2021**
Plomb	**Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb** **Date d'effet : 14/02/2014 - Date d'expiration : 13/02/2019**

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 08/08/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des contrats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 21 juillet 2011 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - CPDI 2580 V3
