Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20
CP - Ville :	40000 MONT DE MARSAN
Référence client :	MM06_01_0020_RAAT_2017
Date du repérage :	09/02/2017
Désignation :	MM06_01_0020_RAAT_2017



Présence d'amiante	Non
Présence de pièce(s) non visitée(s)	Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.

Sommaire

Rapport	Annexes
- **Renseignements administratifs** A - Désignation de l'immeuble B - Propiétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées **- Etude Préalable** F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes **Conditions de repérage** N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation **Conclusions** P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités **Grille de résultats du repérage**	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélevements et analyses Annexe : Prélevements et analyses

Renseignements administratifs

A Designation de l'immeuble

Adresse :	193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 40000 MONT DE MARSAN
Référence client :	MM06_01_0020_RAAT_2017
Désignation :	MM06_01_0020_RAAT_2017
Date de construction :	

B Propriétaire / Donneur d'ordre

Propriétaire : Sté XL HABITAT - Office Public de l'Habitat des Landes

Adresse : 953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341 40011 MONT de MARSAN Cedex

Donneur d'ordre : Sté XL HABITAT - Office Public de l'Habitat des Landes

Adresse : 953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341 40011 MONT de MARSAN Cedex

C Opérateur de repérage

Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)
Nom :	CHARLESARISTIDE ELIE
Accompagnateur :	Roullier Anthony (05 33 89 12 90)
Date de repérage	09/02/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre

Numéro attestation : AMIANTE
Délivré le : 08/12/2016

D Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020

Nom : MORA Denis

Date du rapport : 15/02/2017
A Riorges, le 15/02/2017

Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées

Liste des locaux visités :

MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 1 (Entrée)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)
MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 4 (W.C)
MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 5 (Dégagement)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 6 (Chambre)
MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

- Changements des revêtements de sol dans la salle à manger, la chambre 1, la cuisine et la salle de bain
- Percement du sol dans la salle à manger, la chambre 1, la cuisine et la salle de bain
- Travaux de peinture courant sur les murs et les plafonds dans la salle à manger, la chambre 1, la cuisine, la salle de bain et l'entrée
- Remplacement du vitrage dans la salle à manger
- Encastrement d'appareillage électrique dans murs (prise-interrupteur) dans l'entrée et la salle à manger
- Dépose et repose de l'évier dans la salle de bain

G Périmètre du bâtiment concerné

Le périmètre d'intervention concerne la salle à manger, la chambre 1, la cuisine, la salle de bain et l'entrée

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (SDB)	
Revêtement de sol	MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 7 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accèder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
- prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
- Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
- La liste des matériaux et produits suceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Materiau	Justification
Vol 2 (Séjour)		Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif
Vol 6 (Chambre)		Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif
Vol 5 (Dégagement)		Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sans objet

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Combles - MM06_01_0020_RAAT_2017	Moyen investigation non mis a disposition	Combles Trappe non accessible

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 6 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 6 (Chambre) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002RT000038 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°4 - 1	P4	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002RT000038 n°4 - 1	P4	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002RT000038 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°6 - 1	P6	Enduit gris en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002RT000038 n°6 - 1	P6	Enduit gris en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002RT000038 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002RT000038 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°1 - 1	P1	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002RT000038 n°1 - 1	P1	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol		I1			I1 - 1				Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol		I1			I1 - 1				Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol		I1			I1 - 1				Parquet bois, investigations impossibles sans sondage destructif
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°2 - 1	P2 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène + colle grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°2 - 1	P2 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°2 - 1	P2 Phase 3	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
MM06_01_0020_RAAT_2017	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélevement		002RT000038 n°2 - 1	P2 Phase 4	Revêtement souple bleu	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[redacted]	MM06_01_0020_RAAT_2017	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Plan de repérage - Actions menées

MM06_01_0020_RAAT_2017 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002RT000038

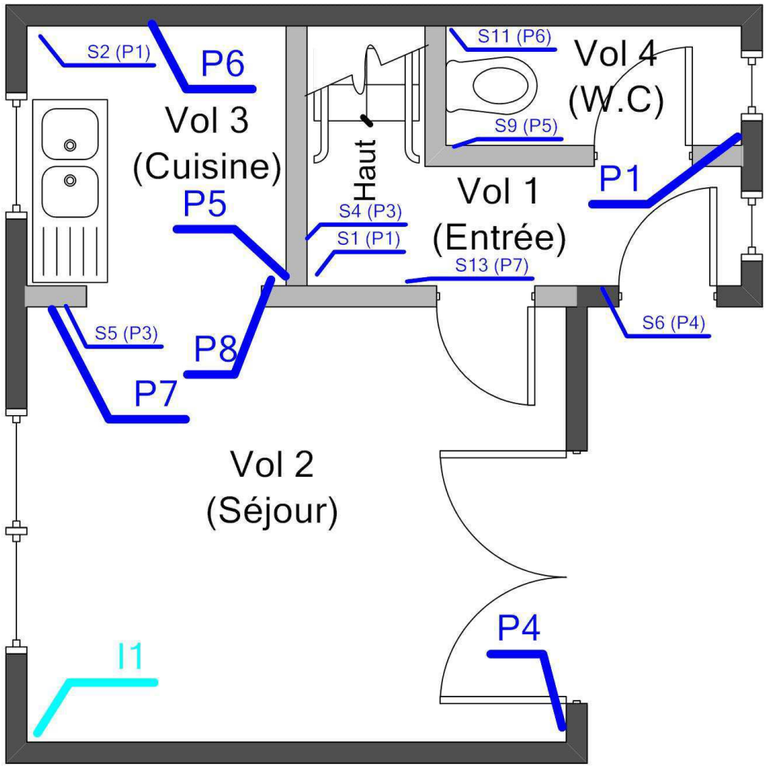

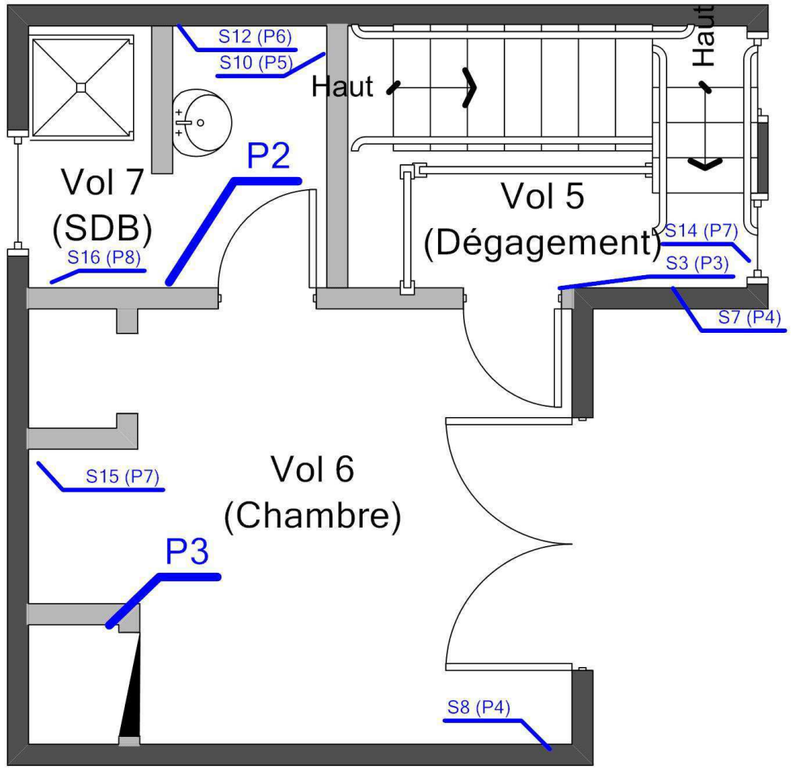

Etage

Mur porteur

Cloison

Panneau préfa/placo

Légende

P	Localisation dun prélèvement
I	Localisation dune impossibilité technique
S	Localisation dun sondage négatif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 40000 MONT DE MARSAN	MM06_01_0020_RAAT_2017	09/02/2017	CHARLESARISTIDE ELIE

ANNEXE : Reportage photographique

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002RT000038 n°1 - 1 (P1)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 4 (W.C)	Prélevement
002RT000038 n°2 - 1 (P2)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	Prélevement
002RT000038 n°3 - 1 (P3)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement
002RT000038 n°4 - 1 (P4)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002RT000038 n°5 - 1 (P5)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002RT000038 n°6 - 1 (P6)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
002RT000038 n°7 - 1 (P7)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)	Prélevement
002RT000038 n°8 - 1 (P8)	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement
	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)	I1

002RT000038 n°1 - 1 (P1)



002RT000038 n°2 - 1 (P2)



002RT000038 n°3 - 1 (P3)



002RT000038 n°4 - 1 (P4)



002RT000038 n°5 - 1 (P5)



002RT000038 n°6 - 1 (P6)



002RT000038 n°7 - 1 (P7)



002RT000038 n°8 - 1 (P8)



I1 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 4 (W.C)	
P2 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + colle grise non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	
P2 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	
P2 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	
P2 Phase 4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 7 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 6 (Chambre)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres + peinture non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 2 (Séjour)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	MM06_01_0020_RAAT_2017 - Vol 3 (Cuisine)	

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20894 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20894
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 4 (W.C)

Description ITGA	Colle grise / Matériau compact gris hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20895 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20895
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (SDB)

Description ITGA	Revêtement souple bleu / Joint cassant gris / Colle polymère jaune / Matériau compact gris hétérogène / Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple bleu	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	2
Joint cassant gris	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Colle polymère jaune	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	2
Matériau compact gris hétérogène + colle grise non séparable	META le 15/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20896 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20896
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 6 (Chambre)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20897 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20897
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (Séjour)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peintures multiples non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20898 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20898
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec fibres + peinture non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20899 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20899
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peintures multiples avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peintures multiples avec couche en toile non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20900 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20900
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Séjour)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-20901 EN DATE DU 15/02/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. ELIE CHARLESARISTIDE
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-13334
Echantillon ITGA : IT071702-20901
Reçu au laboratoire le : 13/02/2017

Réf. Client :

Commande	002RT000038
Dossier client	MM06_01_0020_RAAT_2017 193 RUE CAPITAINE R BONNEMAIRE - PORTE 20 - 40000 MONT DE MARSAN MM06_01_0020_RAAT_2017
Echantillon	002RT000038008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 14/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Annexe : Documents

QBE

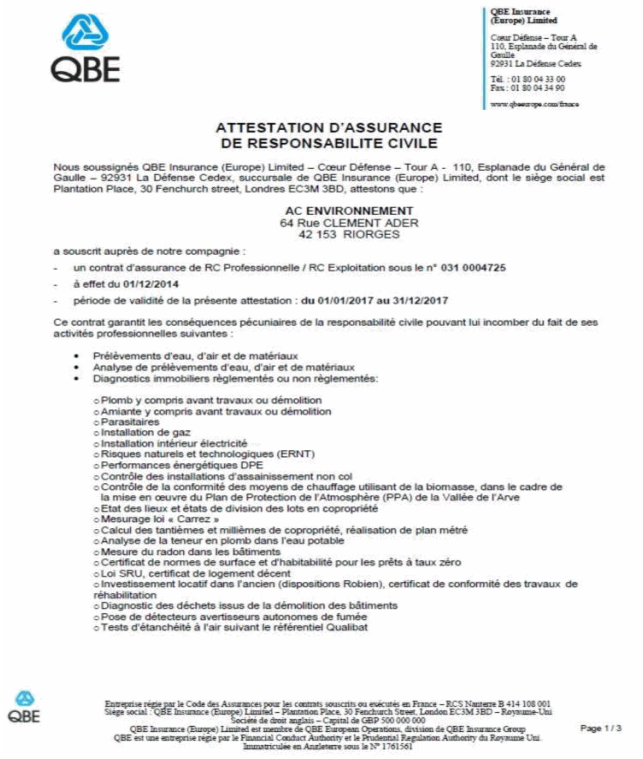

QBE Insurance
(Europe) Limited

Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex

Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90

www.qbeeurope.com/france

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
64 Rue CLEMENT ADER
42 153 RIORGES

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers règlementés ou non règlementés:
  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non col
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - Loi SRU, certificat de logement décent
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
  - Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat

QBE

Entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France – RCS Nanterre B 414 108 001
Siège social : QBE Insurance (Europe) Limited – Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni
Société de droit anglais – Capital de GBP 500 000 000
QBE Insurance (Europe) Limited est membre de QBE European Operations, division de QBE Insurance Group
QBE est une entreprise régie par le Financial Conduct Authority et le Prudential Regulation Authority du Royaume Uni.
Immatriculée en Angleterre sous le N° 1761561

Assurance1-3

QBE

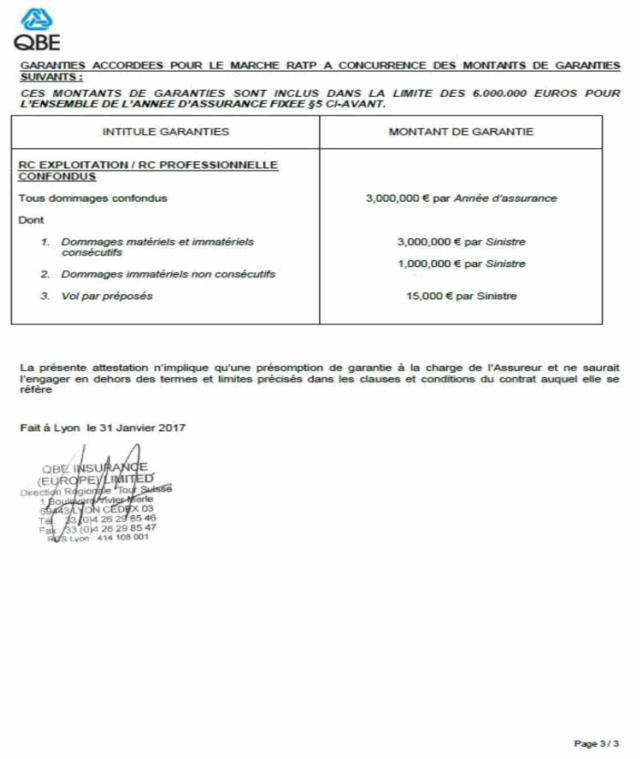

GARANTIES ACCORDEES POUR LE MARCHE RATP A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

CES MONTANTS DE GARANTIES SONT INCLUS DANS LA LIMITE DES 6.000.000 EUROS POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNEE D'ASSURANCE FIXEE §5 CI-AVANT.

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION / RC PROFESSIONNELLE CONFONDUS	
Tous dommages confondus	3,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	3,000,000 € par *Sinistre*
2. *Dommages immatériels non consécutifs*	1,000,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15,000 € par Sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 31 Janvier 2017

QBE INSURANCE
(EUROPE) LIMITED
Direction Régionale Tour Suisse
1 Boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03
Tél. : 33 (0)4 26 29 85 46
Fax : 33 (0)4 26 29 85 47
RCS Lyon : 414 108 001

Assurance3-3

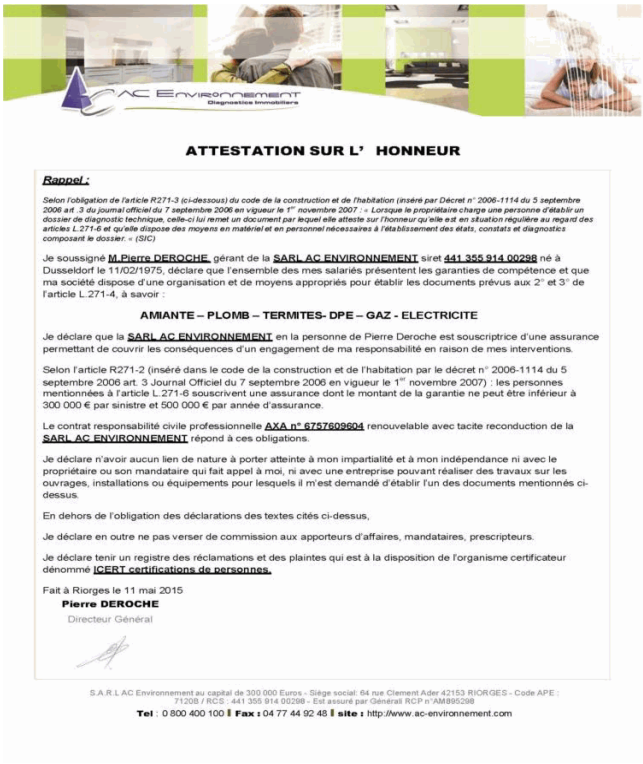

ATTESTATION SUR L' HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007 : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » (SIC)

Je soussigné **M.Pierre DEROCHE**, gérant de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** siret **441 355 914 00298** né à Dusseldorf le 11/02/1975, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE – PLOMB – TERMITES- DPE – GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la **SARL AC ENVIRONNEMENT** en la personne de Pierre Deroche est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle **AXA n° 6757609604** renouvelable avec tacite reconduction de la **SARL AC ENVIRONNEMENT** répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition de l'organisme certificateur dénommé **ICERT certifications de personnes.**

Fait à Riorges le 11 mai 2015

Pierre DEROCHE

Directeur Général

S.A.R.L AC Environnement au capital de 300 000 Euros - Siège social: 64 rue Clement Ader 42153 RIORGES - Code APE : 7120B / RCS : 441 355 914 00298 - Est assuré par Général RCP n°AM895298

Tel : 0 800 400 100 ▮ **Fax :** 04 77 44 92 48 ▮ **site :** http://www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

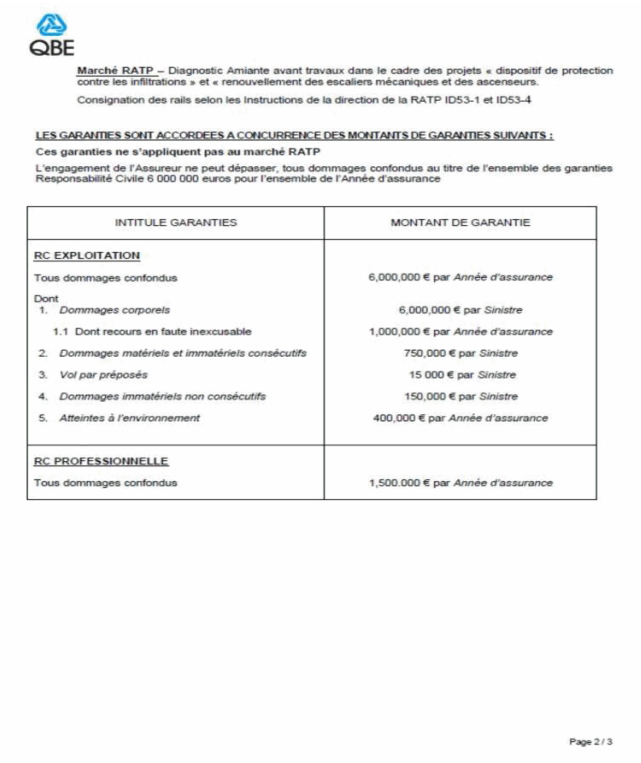

QBE

Marché RATP – Diagnostic Amiante avant travaux dans le cadre des projets « dispositif de protection contre les infiltrations » et « renouvellement des escaliers mécaniques et des ascenseurs.

Consignation des rails selon les Instructions de la direction de la RATP ID53-1 et ID53-4

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

Ces garanties ne s'appliquent pas au marché RATP

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

INTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE	
Tous dommages confondus	1,500.000 € par *Année d'assurance*

Assurance2-3



I.Cert Institut de Certification

Décision de certification

AC ENVIRONNEMENT
à l'attention de CHARLES ARISTIDE Elie
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Nous avons l'honneur de vous transmettre vos résultats d'examens de certification.

Amiante **Réussite à la certification** **Date de décision : 08/12/2016**

AMIANTE RECERTIFICATION
Les conditions de recertification amiante prévoient également la réalisation d'une surveillance documentaire liée à l'exercice de votre activité de diagnostiqueur Amiante.
La réussite de votre examen de recertification AMIANTE ne pourra être prononcée que lorsque cette surveillance documentaire sera validée.

Le cas échéant, votre certificat de compétences vous sera adressé prochainement.
Si vous avez échoué à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter pour planifier des sessions de rattrapage - 0810 057 570.
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Date : 08/12/2016

Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02 90 09 35 02 - Fax : 02 99 65 07 25 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 20 - APE-NAF 8299Z

ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE - AMIANTE
