Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS



A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

Adresse : 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN

Référence client : MM09_01_0012

Désignation : MM09_01_0012

Date de construction : Avant 1997

A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :
OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES
953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341
40011 MONT de MARSAN Cedex

Donneur d'ordre :
OPH XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DES LANDES
953 avenue du Colonel Rozanoff - BP 341
40011 MONT de MARSAN Cedex

A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : VERGEZ Kévin

Accompagnateur : Dagrau Jérémie (05 33 01 03 01)

Date de repérage 24/05/2019

Numéro attestation : Amiante

Délivré le : 03/03/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire



A-4 SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 441355914)

Date du rapport : 05/06/2019

Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (validité début : 01/01/2019 - fin : 31/12/2019)

A Riorges, le 05/06/2019

PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

B - Sommaire

C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

D- Etude préalable
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

E - Conditions de repérage
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation

F - Conclusions
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

G - Grille de résultats du repérage

Annexes

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	MM09_01_0012 - Vol 2 (Salon)
MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	MM09_01_0012 - Vol 4 (W.C)
MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)	MM09_01_0012 - Vol 6 (Chambre 1)
MM09_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)	MM09_01_0012 - Vol 8 (SDB)
MM09_01_0012 - Vol 9 (Chambre 3)	MM09_01_0012 - Vol 10 (Chambre 4)

C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait qu'en présence de locaux ou de partie de locaux non visités, ses obligations réglementaires ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article R1334-19 du Code de la santé publique.

D - ÉTUDE PRÉALABLE

D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

- Changement des revêtements de sol (y compris recouvrement) dans l'ensemble du logement excepté la salle de bain.
- Reprise des enduits muraux.
- Travaux de peinture courant sur les murs et plafonds.
- Mise en peinture des menuiseries.
- Encastrement d'appareillage électrique dans murs (prise – interrupteur).
- Dépose et repose de l'évier dans la cuisine.

D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

- Le périmètre d'intervention concerne l'ensemble du logement.

D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux de démolition sont programmés.

D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et parties de composant des catégories suivantes conformément à la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique.

Ouvrages/parties d'ouvrage inspectés	Plan de l'immeuble	Locaux	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 4)	
Plafond et faux-plafonds	MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 4)	
Revêtement de sol	MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 4)	
Equipements divers et accessoires	MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	

D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants de la liste C de l'annexe 13-9 du Code de la santé publique et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

F - CONCLUSIONS

F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf prél.
Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8 Phase 1
Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8 Phase 1
Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9 Phase 2
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10 Phase 1
Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11
Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2
Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13 Phase 2

F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RÉSULTAT DE REPÉRAGE

1 - Parois verticales intérieures et enduits

2 - Plafond et faux-plafonds

3 - Revêtement de sol

4 - Revêtement de mur

5 - Equipements divers et accessoires

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S9	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S10	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 10 (Chambre 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S11	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 5 (Couloir)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S12	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S13	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Salon) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P3 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3		002FP00344 3 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P4	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP00344 3 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP00344 3 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S15 - S16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P4		002FP00344 3 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP00344 3 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S17	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP00344 3 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP00344 3 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits plâtre	P5 - S17 - S18	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P5		002FP00344 3 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	P6	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 8 (SDB)	Murs et cloisons	Enduits plâtre	S19	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P6		002FP00344 3 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P16	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P16	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S25	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S26	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S27	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 10 (Chambre 4)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S28	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S29	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 8 (SDB)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S30	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S31	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S32	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 5 (Couloir)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (Salon) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (SDB) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (Couloir)	Menuiseries	Peinture sur boiserie	P16 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16		002FP00344 3 n°16 - 1	P16	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduits plâtre	P1	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Plafonds	Enduits plâtre	S1	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Plafonds	Enduits plâtre	S2	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 10 (Chambre 4)	Plafonds	Enduits plâtre	S3	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Plafonds	Enduits plâtre	S4	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Plafonds	Enduits plâtre	S5	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 5 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Chambre 4) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 5 (Couloir)	Plafonds	Enduits plâtre	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P1		002FP00344 3 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduits plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement		002FP00344 3 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C)	Plafonds	Enduits plâtre	S7	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP00344 3 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP00344 3 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C) - Vol 8 (SDB)	Plafonds	Enduits plâtre	S7 - S8	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2		002FP00344 3 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P7	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P7		002FP00344 3 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002FP00344 3 n°8 - 1	P8 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 2 (Salon)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S21 (P8)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P8		002FP00344 3 n°8 - 1	P8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°9 - 1	P9 Phase 1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°9 - 1	P9 Phase 2	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°10 - 1	P10 Phase 1	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P10	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°10 - 1	P10 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P11	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°11 - 1	P11	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune non séparable	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 5 (Couloir)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P12	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 1	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 1	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 1	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 1	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P13	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 2	Dalle dure cassante blanche	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S22 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 2	Dalle dure cassante blanche	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 10 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S23 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 2	Dalle dure cassante blanche	Positif	Présence sur analyse
MM09_01_0012	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S24 (P13)	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P13		002FP00344 3 n°13 - 1	P13 Phase 2	Dalle dure cassante blanche	Positif	Présence sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°14 - 1	P14 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002FP00344 3 n°14 - 1	P14 Phase 1	Carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°14 - 1	P14 Phase 2	Colle beige + matériau souple jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P14		002FP00344 3 n°14 - 1	P14 Phase 2	Colle beige + matériau souple jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Equipements divers et accessoires


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	Conclusion
MM09_01_0012	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P15	Réalisation d'un prélevement		002FP00344 3 n°15 - 1	P15	Matériau bitumineux noir avec couche souple et poussières	Négatif	Négatif sur analyse

ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	MM09_01_0012	MM09_01_0012 - Plan de repérage - Actions menées
	MM09_01_0012	MM09_01_0012 - MPCA Toutes catégories confondues

MM09_01_0012 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FP003443

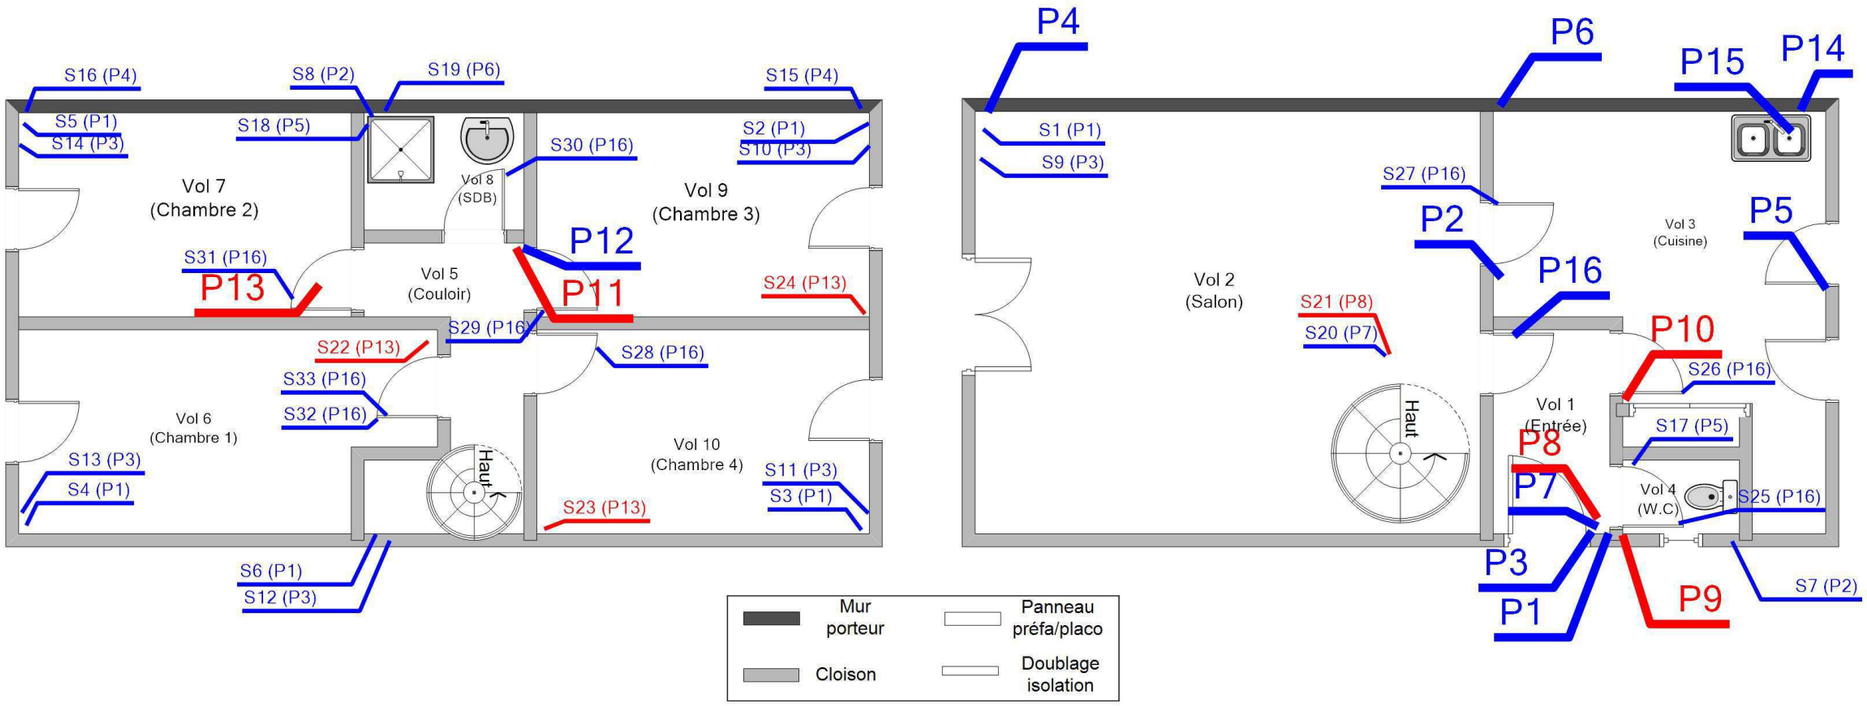


Légende


P	Localisation dun prélèvement positif
P	Localisation dun prélèvement négatif
S	Localisation dun sondage négatif
S	Localisation dun sondage positif

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN	MM09_01_0012	24/05/2019	VERGEZ Kévin

MM09_01_0012 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FP003443

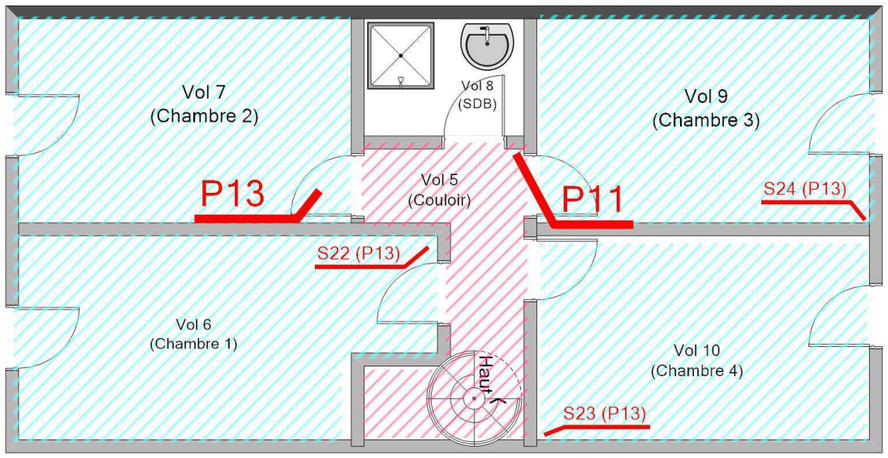

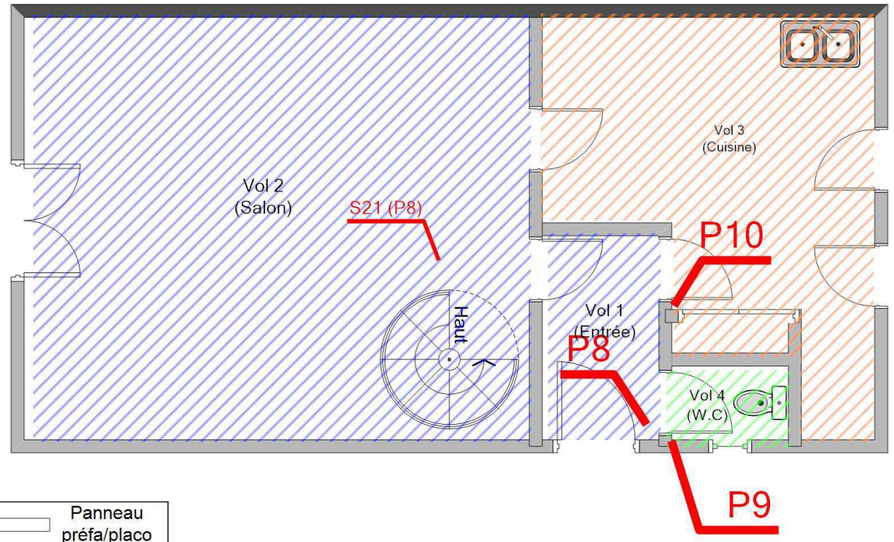

Mur porteur
Panneau préfa/placo
Cloison
Doublage isolation

Légende

	P10 : Dalle dure cassante beige
	P8 : Dalle dure cassante beige
	P9 : Dalle dure cassante beige
	P11 : Dalles plastiques
	P13 : Dalle dure cassante blanche

AC ENVIRONNEMENT
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 40000 MONT DE MARSAN	MM09_01_0012	24/05/2019	VERGEZ Kévin

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FP003443 n°1 - 1 (P1)	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP003443 n°2 - 1 (P2)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP003443 n°3 - 1 (P3)	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP003443 n°4 - 1 (P4)	MM09_01_0012 - Vol 2 (Salon)	Prélevement négatif
002FP003443 n°5 - 1 (P5)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP003443 n°6 - 1 (P6)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP003443 n°7 - 1 (P7)	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FP003443 n°8 - 1 (P8)	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002FP003443 n°9 - 1 (P9)	MM09_01_0012 - Vol 4 (W.C)	Prélevement positif
002FP003443 n°10 - 1 (P10)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002FP003443 n°11 - 1 (P11)	MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)	Prélevement positif
002FP003443 n°12 - 1 (P12)	MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)	Prélevement négatif
002FP003443 n°13 - 1 (P13)	MM09_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement positif
002FP003443 n°14 - 1 (P14)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP003443 n°15 - 1 (P15)	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FP003443 n°16 - 1 (P16)	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif



002FP003443 n°1 - 1 (P1) - MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)



002FP003443 n°2 - 1 (P2) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)




002FP003443 n°3 - 1 (P3) - MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)



002FP003443 n°4 - 1 (P4) - MM09_01_0012 - Vol 2 (Salon)



002FP003443 n°5 - 1 (P5) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)

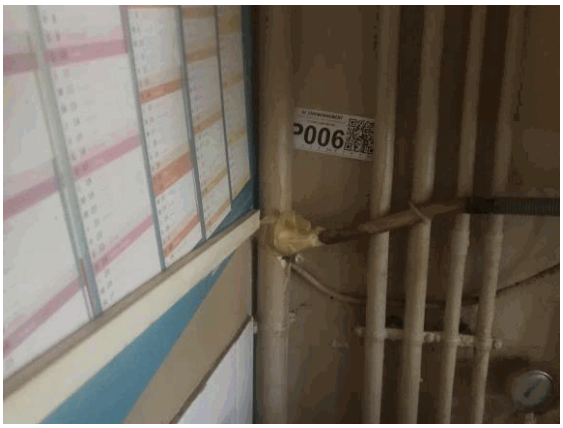

002FP003443 n°6 - 1 (P6) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)



002FP003443 n°7 - 1 (P7) - MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)




002FP003443 n°8 - 1 (P8) - MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)



002FP003443 n°9 - 1 (P9) - MM09_01_0012 - Vol 4 (W.C)



002FP003443 n°10 - 1 (P10) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)

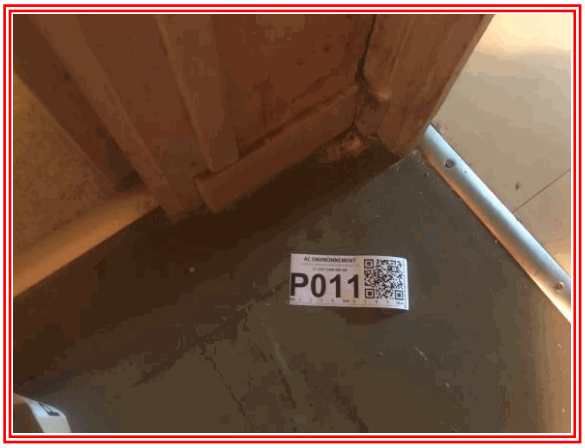

002FP003443 n°11 - 1 (P11) - MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)



002FP003443 n°12 - 1 (P12) - MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)



002FP003443 n°13 - 1 (P13) - MM09_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)



002FP003443 n°14 - 1 (P14) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)



002FP003443 n°15 - 1 (P15) - MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)



002FP003443 n°16 - 1 (P16) - MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 2 (Salon)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)	
P9 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 4 (W.C)	
P9 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	MM09_01_0012 - Vol 4 (W.C)	
P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	MM09_01_0012 - Vol 5 (Couloir)	
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	MM09_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)	
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante blanche - -	MM09_01_0012 - Vol 7 (Chambre 2)	
P14 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)	

P14 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau souple jaune non séparable - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)
P15	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir avec couche souple et poussières - -	MM09_01_0012 - Vol 3 (Cuisine)
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peintures multiples en vrac - -	MM09_01_0012 - Vol 1 (Entrée)

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-431 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-431
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-432 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-432
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduits plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-433 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-433
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-434 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-434
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 2 (Salon)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-435 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-435
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-436 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-436
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduits plâtre / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-437 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-437
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-438 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-438
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Dalle dure cassante beige	META (2) le 04/06/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-439 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-439
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (W.C)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Dalle dure cassante beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1
Dalle dure cassante beige	META (2) le 04/06/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-440 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-440
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Dalle dure cassante beige	META (2) le 04/06/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-441 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-441
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (Couloir)

Description ITGA	Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune non séparable	META (2) le 04/06/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-442 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-442
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (Couloir)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-443 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-443
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 7 (Chambre 2)

Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Dalle dure cassante blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Colle polymère jaune + ragréage gris	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1
Dalle dure cassante blanche	META (2) le 04/06/2019	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-444 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-444
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Matériau souple jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Carrelage	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1
Colle beige + matériau souple jaune non séparable	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-445 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-445
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443015 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche souple et poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Matériau bitumineux noir avec couche souple et poussières	META (2) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D – 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D´ASCQ
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT021906-446 EN DATE DU 05/06/2019

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. KEVIN VERGEZ
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0719-50670
Echantillon ITGA : IT021906-446
Reçu au laboratoire le : 27/05/2019

Réf. Client :

Les informations fournies par le client sont retranscrites dans le tableau ci-dessous.

Commande	002FP003443
Dossier client	MM09_01_0012 13 rue Ferdinand BERNEDE - Porte 0012 - 40000 MONT DE MARSAN MM09_01_0012
Echantillon	002FP003443016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Peinture sur boiserie / Vol 1 (Entrée)

Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  (1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
  (2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique Analytique :


- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Nombre de préparations
Peintures multiples en vrac	META (1) le 04/06/2019	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Emeline HUYSMANS - Analyste



La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ANNEXE: DOCUMENTS

QBE

LES GARANTIES SONT ACCORDEES A CONCURRENCE DES MONTANTS DE GARANTIES SUIVANTS :

L'engagement de l'Assureur ne peut dépasser, tous dommages confondus au titre de l'ensemble des garanties Responsabilité Civile 6 000 000 euros pour l'ensemble de l'Année d'assurance

NTITULE GARANTIES	MONTANT DE GARANTIE
RC EXPLOITATION	
Tous dommages confondus	6,000,000 € par *Année d'assurance*
Dont	
1. *Dommages corporels*	6,000,000 € par *Sinistre*
1.1 Dont recours en faute inexcusable	1,000,000 € par *Année d'assurance*
2. *Dommages matériels et immatériels consécutifs*	750,000 € par *Sinistre*
3. *Vol par préposés*	15 000 € par *Sinistre*
4. *Dommages immatériels non consécutifs*	150,000 € par *Sinistre*
5. *Atteintes à l'environnement*	400,000 € par *Année d'assurance*
RC PROFESSIONNELLE/ RC PRODUITS LIVRES	
Tous dommages confondus Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus Dont	1 500,000 € par *Année d'assurance*
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs confondus trouvant sur origine dans une erreur de diagnostic	350 000 € par sinistre

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur et ne saurait l'engager en dehors des termes et limites précisés dans les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère

Fait à Lyon le 21 Décembre 2018

QBE Insurance (Europe) Limited
Direction Régionale Grand Sud-Est
1 boulevard Vivier Merle
69443 LYON CEDEX 03
Gestion des polices : 04 26 83 82 76

Page 3 / 3

Assurance 3/3

QBE

- Tests d'étanchéité à l'air suivant le référentiel Qualibat
- Diagnostiques d'assainissement collectif et individuel .
- Diagnostic d'accessibilité Handicapés

Ainsi que toute activité accessoire non aggravante directement liée à l'activité principale

Et à l'exclusion de tout diagnostic :

- Relatif à une étude concernant la pollution des sol
- Relatif à la détection de légionnelle effectuée dans des établissements de soins, des maisons de retraite, des établissements scolaires et parascolaires.

Page 2 / 3

Assurance 2/3

GROUPE AC ENVIRONNEMENT

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Rappel :

Selon l'obligation de l'article R271-3 (ci-dessous) du code de la construction et de l'habitation (inséré par Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 du journal officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : « Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier ».

Je soussigné M. Denis MORA, gérant de la SAS AC ENVIRONNEMENT siret 441 355 914 00298 né à Savigny-Sur-Orges le 02/03/1977, déclare que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence et que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés pour établir les documents prévus aux 2° et 3° de l'article L.271-4, à savoir :

AMIANTE - PLOMB - TERMITES - DPE - GAZ - ELECTRICITE

Je déclare que la SAS AC ENVIRONNEMENT en la personne de Denis MORA est souscriptrice d'une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

Selon l'article R271-2 (inséré dans le code de la construction et de l'habitation par le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007) : les personnes mentionnées à l'article L.271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année d'assurance.

Le contrat responsabilité civile professionnelle QBE N°AM895928 renouvelable avec tacite reconduction de la SAS AC ENVIRONNEMENT répond à ces obligations.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus,

Je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02 Janvier 2019

Denis MORA

AC ENVIRONNEMENT - SIÈGE SOCIAL
64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
04 77 44 92 44 - 04 81 17 01 15 - ac.contact@ac-environnement.com
0 800 400 100
www.ac-environnement.com

Attestation sur l'honneur

QBE

QBE Insurance (Europe) Limited
Cœur Défense – Tour A
110, Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex
Tél. : 01 80 04 33 00
Fax : 01 80 04 34 90
www.QBEInsurance.com

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE

Nous soussignés QBE Insurance (Europe) Limited – Cœur Défense – Tour A - 110, Esplanade du Général de Gaulle – 92931 La Défense Cedex, succursale de QBE Insurance (Europe) Limited, dont le siège social est Plantation Place, 30 Fenchurch street, Londres EC3M 3BD, attestons que :

AC ENVIRONNEMENT
SIREN N° 441 355 914
64 rue Clément Ader – 42153 RIORGES
Unités techniques : Amiante – Riorges
Accréditation N° 1-6001 rév 1 valable jusqu'au 31/08/2019

a souscrit auprès de notre compagnie :

- un contrat d'assurance de RC Professionnelle / RC Exploitation sous le n° **031 0004725**
- à effet du **01/12/2014**
- période de validité de la présente attestation : **du 01/01/2019 au 31/12/2019**

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles suivantes :

- Prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Analyse de prélèvements d'eau, d'air et de matériaux
- Diagnostics immobiliers réglementés ou non réglementés:
  - Plomb y compris avant travaux ou démolition
  - Amiante y compris avant travaux ou démolition
  - Parasitaires
  - Installation de gaz
  - Installation intérieur électricité
  - Risques naturels et technologiques (ERNT)
  - Performances énergétiques DPE
  - Contrôle des installations d'assainissement non collectif
  - Contrôle de la conformité des moyens de chauffage utilisant de la biomasse, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Vallée de l'Arve
  - Etat des lieux et états de division des lots en copropriété
  - Mesurage loi « Carrez »
  - Calcul des tantièmes et millièmes de copropriété, réalisation de plan métré
  - Analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable
  - Mesure du radon dans les bâtiments
  - Certificat de normes de surface et d'habitabilité pour les prêts à taux zéro
  - Loi SRU, certificat de logement décent
  - Investissement locatif dans l'ancien (dispositions Robien), certificat de conformité des travaux de réhabilitation
  - Diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments
  - Pose de détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

QBE Insurance (Europe) Limited est une entreprise régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou encaissés en France, inscrite sur le RCS de Nanterre sous le numéro B 414 108 001. Son siège social est situé Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London EC3M 3BD – Royaume-Uni.
QBE Insurance (Europe) Limited est une société de droit anglais au capital de GBP 160 000 000.
QBE Insurance (Europe) Limited est membre du QBE European Operations, division du QBE Insurance Group.
QBE Insurance (Europe) Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et est régie par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Elle est immatriculée en Angleterre sous le n° 1741561.

Page 1 / 3

Assurance 1/3

ANNEXE: DOCUMENTS



I.Cert Institut de Certification

Décision de certification

AC ENVIRONNEMENT
à l'attention de VERGEZ Kévin
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Nous avons l'honneur de vous transmettre vos résultats d'examens de certification.

Amiante sans mention **Réussite à la certification** **Date de décision : 03/03/2017**

AMIANTE RECERTIFICATION
Les conditions de recertification amiante prévoient également la réalisation d'une surveillance documentaire liée à l'exercice de votre activité de diagnostiqueur Amiante.
La réussite de votre examen de recertification AMIANTE ne pourra être prononcée que lorsque cette surveillance documentaire sera validée.

Le cas échéant, votre certificat de compétences vous sera adressé prochainement.
Si vous avez échoué à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter pour planifier des sessions de rattrapage - 0810 057 570.
A votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions, d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Date : 03/03/2017

Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02 90 09 35 02 - Fax : 02 99 65 07 25 - contact@icert.fr
SAS au capital 40000€ - RCS Rennes 500764741 - SIRET 500 764 741 000 20 - APE-NAF 8299Z

ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - 35760 ST Grégoire - Amiante
