Département des Landes

Direction Mobilités et Infrastructures
Service Etudes et Grands Travaux Neufs Mont de Marsan

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE

Pouvoir Adjudicateur
Département des Landes

Objet du marché
Affaire n° 2026EGTN0708 Programme 2027 d'Inspections Détaillées d'ouvrages d'art

ANNEXE 4
Modèle de rapport d'inspection détaillée

Département
des Landes

SERVICE GESTIONNAIRE :UTD de

COMMUNE :

IDENTIFIANT :

NOM DE L'OUVRAGE :

RD n°– PR:

INSPECTION DETAILLEE 2027

PHOTO DE L'OUVRAGE

Mettre le logo, nom et adresse de l'entreprise réalisant l'inspection détaillée

SOMMAIRE

1 - RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'OUVRAGE 4

1.1 - IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE 4
1.2 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE 6
1.3 - DESCRIPTION DES ELEMENTS DE L'OUVRAGE 7
1.4 - CONCEPTION - EXECUTION 8
1.5 - VIE DE L'OUVRAGE 8
1.5.1 - ACTIONS DE SURVEILLANCE 8
1.5.2 – TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS 8
1.5.3 – INVESTIGATIONS OU SURVEILLANCES SPECIFIQUES MISES EN OEUVRE 8
1.6 - CONDITION D'EXECUTION DE L'INSPECTION 9
1.7 - CONVENTION DE REPERAGE 9

2 - CONSTATATIONS 10

2.1 - ABORDS ET ACCES 10
2.2 - EQUIPEMENTS SUR OUVRAGE 10
2.3 - EQUIPEMENTS SOUS OUVRAGE 12
2.4 - PARTIE INFERIEURE DU TABLIER 13
2.5 - APPUIS 16
2.6 - PERRES 18
2.7 - FONDATIONS EN SITE AQUATIQUE/ LIT DU COURS D'EAU 18
2.8 - ELEMENTS DE PROTECTIONS EN SITE AQUATIQUE 18
2.9 - APPAREILS D'APPUI 19
2.9.1 - RELEVES DES APPAREILS D'APPUI 20
2.10 - ELEMENTS DE RENFORCEMENT OU DE REPARATION 21
2.11 - DISPOSITIFS DE MESURES EN PLACE 21
2.12 - DISPOSITIFS DE VISITES ET D'ENTRETIEN 21

3 - SYNTHESE 22

3.1 - CONCLUSIONS DE LA DERNIERE ACTION DE SURVEILLANCE 22
3.2 - TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX DESORDRES 22
3.3 - AVIS SUR L'ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE 22
3.3.1 - Structure 22
3.3.2 - Equipement et éléments de protection 22
3.3.3 - Appuis 22
3.4 - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES DESORDRES DEPUIS LA DERNIERE VISITE 23
3.5 - PROPOSITION D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS 23
3.5.1 – Mesures de sécurité 23
3.5.2 - Entretien courant 23
3.5.3 - Entretien spécialisé 23
3.5.4 - Réparations 23
3.6 - PROPOSITION D'INVESTIGATIONS OU DE SURVEILLANCE SPECIFIQUES 23
3.6.1 - Investigations 23
3.6.2 – Surveillances spécifiques 23
3.7 – PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGIME DE SURVEILLANCE 23

4 – NOTATION DE L'OUVRAGE 24

5 – ESTIMATION FINANCIERE 26

6 - ANNEXES 27

6.1 – ANNEXE N°1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 27
6.2 – ANNEXE N°2 : PLANS DE L'OUVRAGE 27
6.3 – ANNEXE N°3 : PLANS ET SCHEMAS DES DESORDRES 27

1 - RENSEIGNEMENT CONCERNANT L'OUVRAGE

1.1 - IDENTIFICATION DE L'OUVRAGE

PLAN DE SITUATION

PLAN DE SITUATION
(en couleur)

Identification	:	
Nom de l'ouvrage	:	
Commune	:	
Voie portée:	:	
PR	:	
Voie ou obstacle franchie	:	
Coordonnée GPS	:	
Site d'exposition	:	
Maître d'ouvrage	:	Conseil Départemental des Landes
Maître d'oeuvre	:	Direction Mobilités et Infrastructures / Service Etudes et Grands Travaux Neufs
Service gestionnaire	:	

1.2 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'OUVRAGE

Type de structure	:		
Nature des matériaux	:		
Type de fondation	:		
Nombre de travées	:		
Ouverture des travées	:		
Portées des travées	:		
Longueur de la brèche	:		
Longueur OA / hors tout	:		
Tirant d'air	:		
Tirant d'eau	:		
Largeur hors tout	:		
Largeur de la chaussée (voie portée)	:		
Largeur des trottoirs (voie portée)	:	Gauche :	Droit :
Largeur entre garde-corps	:		
Hauteur des garde-corps	:	Gauche :	Droit
Restriction de circulation	:		
Réseau de concessionnaires visible sur OA	:		
Particularité géométriques (biais, courbure)	:		

NB : Si la voie franchie est une route, stipuler également les largeurs de la chaussée et des trottoirs ou accotements.

1.3 - DESCRIPTION DES ELEMENTS DE L'OUVRAGE

(liste non exhaustive à adapter selon l'ouvrage inspecté)

Situation	Elément	Type – matériau
Abord et accès	Berges / talus	
	Chaussée	
	Trottoirs / accotement	
	Dispositif de retenue	
Partie supérieure de l'ouvrage	Chaussée	
	Trottoirs	
	Joints de chaussée	
	Joints de trottoir	
	Corniches	
	Dispositif de retenue	
Partie inférieure de l'ouvrage	Tablier	
	Elargissement	
Appuis	Culée	
	Piles	
Appareils d'appuis	Sur culées	
	Sur piles	
Eléments de protection	Perré - ¼ de cône	
	Radier	

1.4 - CONCEPTION - EXECUTION

Entreprise constructrice :

Date de construction :

Date de mise en service :

Mode de construction :

Règlement de charges :

Prise en compte de charges exceptionnelles :

Particularités :

1.5 - VIE DE L'OUVRAGE

1.5.1 - ACTIONS DE SURVEILLANCE

Date	Type de visite	Commentaires

1.5.2 – TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS

Date	Travaux effectués et localisation

1.5.3 – INVESTIGATIONS OU SURVEILLANCES SPECIFIQUES MISES EN OEUVRE


Date	Commentaires

1.6 - CONDITION D'EXECUTION DE L'INSPECTION

Date	:
Ingénieur responsable de l'IDP	:
Equipe d'inspection	:
Moyens mis en oeuvre + Matériel de mesure utilisé	:
Météo	:
Température ambiante	:
Restriction de circulation mis en oeuvre	:
Conditions particulières de l'intervention	:

1.7 - CONVENTION DE REPERAGE

(à mettre en adéquation avec l'ouvrage inspecté)

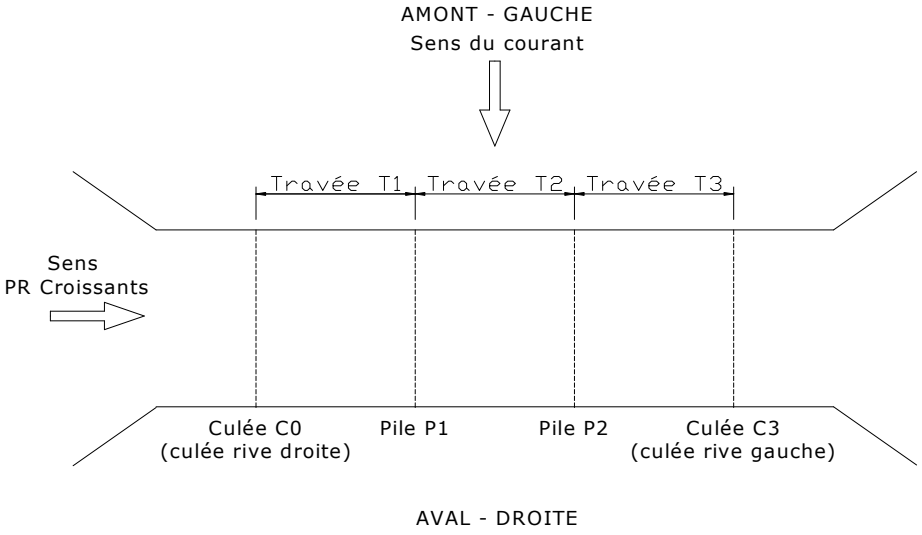

2 - CONSTATATIONS

Ce chapitre relatif aux constatations et mesures effectuées dans le cadre de l'inspection devra faire l'objet d'un inventaire exhaustif de toutes les parties d'ouvrage avec relevés des désordres, leurs descriptions, importance et origine avec la référence aux photos, plans et dessins de l'inspection.

La forme de la description des désordres relevés sont laissés à l'appréciation du titulaire du marché (tableau, littéraire…) mais après accord du pouvoir adjudicateur.

A titre d'indication, les parties d'ouvrages sont à minima les suivantes :

2.1 - ABORDS ET ACCES

2.2 - EQUIPEMENTS SUR OUVRAGE

2.3 - EQUIPEMENTS SOUS OUVRAGE

2.4 - PARTIE INFERIEURE DU TABLIER

(Les constatations par élément seront faites pour chaque travée ou voûte)

2.5 – APPUIS

2.6 – PERRES

2.7 - FONDATIONS EN SITE AQUATIQUE/ LIT DU COURS D'EAU

2.8 - ELEMENTS DE PROTECTIONS EN SITE AQUATIQUE

2.9 - APPAREILS D'APPUI

2.9.1 - RELEVES DES APPAREILS D'APPUI

2.10 - ELEMENTS DE RENFORCEMENT OU DE REPARATION

2.11 - DISPOSITIFS DE MESURES EN PLACE

2.12 - DISPOSITIFS DE VISITES ET D'ENTRETIEN

3 - SYNTHESE

3.1 - CONCLUSIONS DE LA DERNIERE ACTION DE SURVEILLANCE

3.2 - RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX DESORDRES

3.3 - AVIS SUR L'ETAT GENERAL DE L'OUVRAGE

3.3.1 - Structure

3.3.2 - Equipement et éléments de protection

3.3.3 - Appuis

3.4 - ANALYSE DE L'EVOLUTION DES DESORDRES DEPUIS LA DERNIERE VISITE

3.5 - PROPOSITION D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS

3.5.1 – Mesures de sécurité

3.5.2 - Entretien courant

3.5.3 - Entretien spécialisé

3.5.4 - Réparations

3.6 - PROPOSITION D'INVESTIGATIONS OU DE SURVEILLANCE SPECIFIQUES

3.6.1 - Investigations

3.6.2 – Surveillances spécifiques

3.7 – PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGIME DE SURVEILLANCE

4 – NOTATION DE L'OUVRAGE

➔ *Pour pont maçonnerie, Cadre, PICF et Buse*

Selon fiche jointe ci-après

	CLASSE	SECURITE
Equipements		
Structure		
CLASSE DE L'OUVRAGE		

➔ *Pour pont à dalle, pont à poutres, pont à poutrelles enrobées etc. :*

Selon fiche jointe ci-après

	CLASSE	SECURITE
Equipements		
Tablier		
Appuis		
CLASSE DE L'OUVRAGE		

1	Ouvrage en bon état relevant de l'entretien courant.
2	Ouvrage dont la structure est en bon état mais nécessitant un entretien spécialisé.
2E	Ouvrage dont la structure est en bon état mais nécessitant un entretien spécialisé urgent pour prévenir le développement rapide des désordres
3	Ouvrage dont la structure est altérée nécessitant des travaux de réparation sans caractère d'urgence.
3U	Ouvrage dont la structure est gravement altérée nécessitant des travaux de réparation urgent liés à l'insuffisance de capacité portante de l'ouvrage ou à la rapidité d'évolution des désordres.

Sécurité :

A la note pourra être rajouté la mention S. Cela signifie qu'il existe un désordre ou une non-conformité à des règlements de sécurité, qui n'altère en rien la stabilité de l'ouvrage mais qui présente un risque pouvant mettre en cause la sécurité des usagers et nécessitant de ce fait d'être traité de manière urgente.

Mettre ici la fiche de notation IQOA adaptée selon le type de pont

Ponts en Maçonnerie

EQUIPEMENTS		
SUR OUVRAGE		
	CLASSE	**S**
Chaussée		
Trottoirs et bordures		
Dispositifs de retenue		
Corniches		
Dispositifs d'évacuation des eaux		
Joints de chaussée et de trottoirs		
Autres équipements sur ouvrage		
SOUS OUVRAGE		
	CLASSE	**S**
Chaussée de la voie franchie		
Trottoirs et bordures		
Dispositifs de retenue		
Dispositifs d'évacuation des eaux		
CLASSE DES EQUIPEMENTS		
STRUCTURE (et éléments de protection)		
	CLASSE	**S**
Étanchéité		
Perrés		
Éléments de protection en site aquatique		
Tympans et murs (en retour, en aile ou de tête)		
Voûte et piédroits des culées et des piles		
Fondations - lit du cours d'eau		
Élargissement		
Dispositifs latéraux d'évacuation des eaux		
Éléments de renforcement ou de réparation antérieurs		
CLASSE DE LA STRUCTURE (et des éléments de protection)		

SYNTHÈSE POUR L'OUVRAGE (1)		
	CLASSE	**S**
Équipements		
Structure		
CLASSE DE L'OUVRAGE		

OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS

(1) La classe de synthèse de l'ouvrage est en principe la plus élevée de celles relatives à chacune des parties constitutives**. Le relevé "0" conduit à la classe "1".**

Identifiant:

5 – ESTIMATION FINANCIERE

Ce chapitre détaillera les estimations financières des actions à entreprendre par éléments fonctionnels.

	Nom	Qualité	Emargement
Rapport établi par :			
Rapport visé par :			

6 - ANNEXES

6.1 – ANNEXE N°1 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

6.2 – ANNEXE N°2 : PLANS DE L'OUVRAGE

6.3 – ANNEXE N°3 : PLANS ET SCHEMAS DES DESORDRES
